Documento valido solo per il territorio nazionale (Italia)

RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO POMPE DI CALORE GREE VERSATI V

Spett.le ARGOCLIMA S.p.A. ,

Con la presente siamo a chiedere il PRIMO AVVIAMENTO della pompa di calore Gree Versati V – R290.

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'INSTALLATORE RESPONSABILE DELL'IMPIANTO.

ATTENZIONE: per procedere con l'avviamento è necessario compilare tutti i campi richiesti.

IL MODULO COMPILATO IN MANIERA NON CORRETTA O INCOMPLETA POTRÀ ESSERE RIFIUTATO.

NOME PROGETTO _____

Ubicazione impianto

Nome Sig./Società/Struttura_____

Via/Piazza _____ n°_____

Città _____ CAP _____ Prov. _____ Telefono_____

Rivenditore/Agenzia di vendita _____

Dati installatore

Nome Sig./Società/Stuttura _____

Via/Piazza _____ n° _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Email _____

Indicare preferenza centro assistenza (facoltativo) _____

Data indicativa richiesta per l'avviamento (ca. 10 giorni dall'invio della presente) _____

IMPORTANTE:

ALLEGARE IL PROGETTO OPPURE LO SCHEMA DI IMPIANTO INDICANDO LE UNITÀ INSTALLATE, LE LUNGHEZZE ED I DIAMETRI DELLE CONNESSIONI, I DISLIVELLI E GLI APPARATI INSTALLATI (ES. VALVOLA A 3 VIE, RESISTENZE ECC.).

ALLEGARE INOLTRE ALLA PRESENTE RICHIESTA ANCHE UNA FOTO PANORAMICA DALLA QUALE SI POSSA EVINCERE L'INSTALLAZIONE ESEGUITA A REGOLA D'ARTE.

UNITA' INSTALLATE

1 Modello _____ matricola _____

2 Modello _____ matricola _____

3 Modello _____ matricola _____


4 Modello _____ matricola _____

5 Modello _____ matricola _____

6 Modello _____ matricola _____

PER RICHIEDERE IL PRIMO AVVIAMENTO, L'INSTALLATORE RESPONSABILE DEVE CONFERMARE DI AVERE EFFETTUATO LE SEGUENTI VERIFICHE:


		SI	NO
1	L'unità è stata collocata all'esterno dello stabile in cui è installata rispettando gli **spazi richiesti per l'installazione** ed i **requisiti necessari per l'installazione** indicati nei manuali ufficiali della casa madre;	☐	☐
2	I prodotti sono stati installati **rispettando le prescrizioni di sicurezza per il refrigerante R290** riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale **sicurezza** come previsto dalle norme vigenti;	☐	☐
a.	L'installazione della pompa di calore è avvenuta su singola parete come da figura che segue;	☐	☐

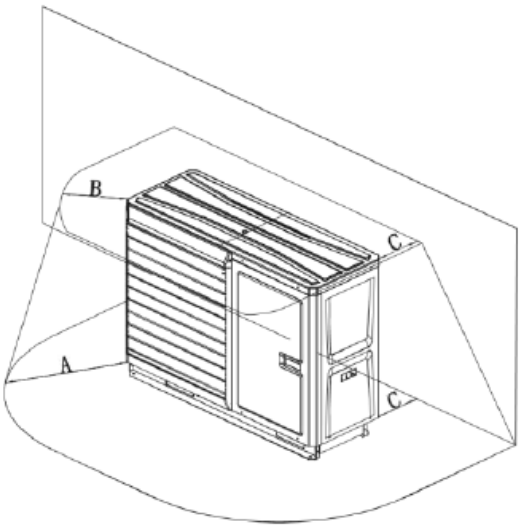

A	B	C
1000	500	300

i.	Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti porte, finestre, bocche di lupo, tombini e/o altre grate a pavimento o parete;	☐	☐
ii.	Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti fonti di innesco (fiamme libere, componenti impianto elettrico, automobili, motoveicoli, apparecchi elettrici non ATEX, ecc.);	☐	☐
iii.	Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti unità di modelli diversi o unità che utilizzano refrigeranti diversi da R290 o altri apparecchi elettromeccanici;	☐	☐

b. L'installazione della pompa di calore è avvenuta in un angolo come da figura che segue; SI ☐ NO ☐

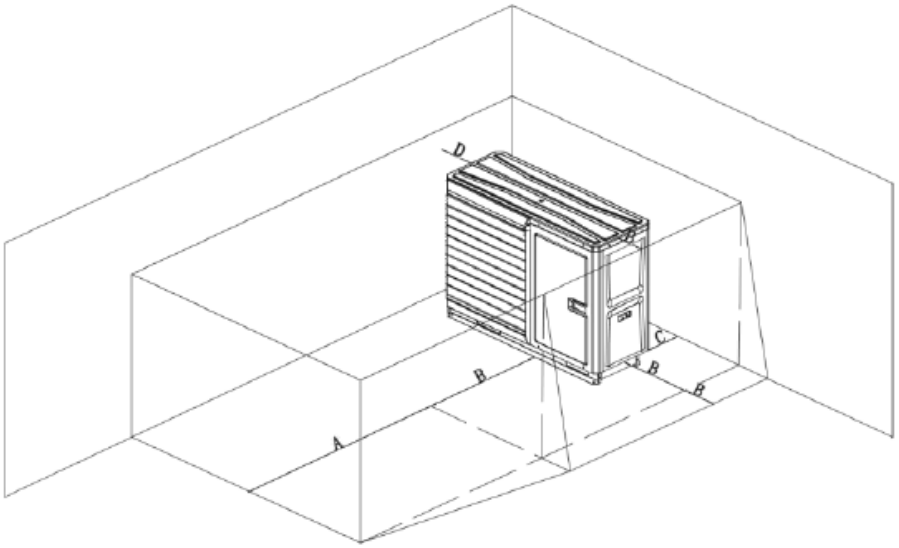

A	B	C	D
2000	500	250	200

i. Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti porte, finestre, bocche di lupo, tombini e/o altre grate a pavimento o parete; ☐ ☐

ii. Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti fonti di innesco (fiamme libere, componenti impianto elettrico, automobili, motoveicoli, apparecchi elettrici non ATEX, ecc.); ☐ ☐

iii. Nell'area di protezione di sicurezza delimitata nella figura sopra sono presenti unità di modelli diversi o unità che utilizzano refrigeranti diversi da R290 o altri apparecchi elettromeccanici; ☐ ☐

N.B.
ALLEGARE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RIFERITA ALL'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI CALORE.
LE UNITÀ INSTALLATE SENZA RISPETTARE I PRESENTI REQUISITI DI SICUREZZA NON SARANNO AVVIATE.

		SI	NO
3	L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato nei manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;	☐	☐
4	Il collegamento idraulico è stato eseguito secondo le norme e le direttive vigenti rispettano le dimensioni delle tubazioni e dei relativi raccordi;	☐	☐
5	I tubi sono stati isolati come indicato nel Manuale di Installazione;	☐	☐
6	È stato installato il filtro dell'acqua all'ingresso dell'evaporatore (*pena la decadenza della Garanzia*) e l'impianto è stato accuratamente lavato;	☐	☐
7	È stato verificato il riempimento dell'impianto idraulico come riportato nel Manuale di Installazione;	☐	☐
8	Il flusso d'acqua per la pompa di calore è sempre garantito;	☐	☐
9	Il volume minimo di acqua nell'impianto è come indicato nel Manuale di Installazione;	☐	☐
10	È stato installato un vaso di espansione idoneo lato impianto	☐	☐
11	È stato installato un vaso di espansione idoneo lato sanitario ACS;	☐	☐
12	È stato installato un addolcitore (verificato PH e durezza acqua);	☐	☐
13	Il circuito idraulico è stato messo in pressione e degassato prima del caricamento	☐	☐
14	Sono state installate le valvole antigelo (obbligatorie) come riportato sui manuali di installazione	☐	☐
15	Solo per sistemi in cascata sono stati correttamente modificati gli indirizzi (switch) in ogni scheda AP1 per ogni unità montata	☐	☐

DESCRIZIONE IMPIANTO:

	SÌ	NO
a. L'impianto è costituito da circuito primario / secondario (il serbatoio inerziale funziona da separatore idraulico)	☐	☐
b. Viene generata acqua calda sanitaria con la presente pompa di calore Se sì, indicare il volume del serbatoio dell'acqua calda sanitaria: ___ Litri	☐	☐
c. È presente una resistenza elettrica ad integrazione per il riscaldamento acqua calda sanitaria ACS	☐	☐
d. Scelta gestione impianto: 1. temperatura di mandata	☐	☐
2. sensore ambiente (ambiente unico)	☐	☐
e. L'impianto verrà gestito unicamente da un termostato di terze parti (non fornito), collegato correttamente nella morsettiera dell'unità, come da manuale.	☐	☐
f. È presente una resistenza elettrica collegata alla PDC per il riscaldamento supplementare dell'impianto	☐	☐
g. È presente una fonte di calore aggiuntiva collegata alla PDC per il riscaldamento dell'impianto (es. caldaia)	☐	☐

Indicare le temperature di esercizio richieste in merito alla tipologia dei terminali installati:

Pavimento/soffitto radiante		Fan coil		Radiatori	A.C.S
Caldo	Freddo	Caldo	Freddo		
----------°C	---------- °C	---------- °C	---------- °C	---------- °C	---------- °C

AVVERTENZE

IL GIORNO DEL PRIMO AVVIAMENTO, L'INSTALLATORE DOVRÀ GARANTIRE AL CENTRO ASSISTENZA DELEGATO QUANTO SEGUE:

- Presenza per tutta la durata del primo avviamento;
- Schemi idraulici ed elettrici dell'impianto;
- Unità alimentata/e elettricamente da almeno 8 ore prima dell'appuntamento con il CAT, per consentire il pre-riscaldamento dell'olio del compressore.

IMPORTANTE

- Il seguente modulo deve essere inoltrato all'indirizzo mail: argo.postvendita@argoclima.com;
- Il Centro Assistenza verificherà che l'installazione sia congruente con il modulo compilato e conforme ai manuali d'installazione;
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore/cliente.
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente ad una tensione non adeguata, non potrà essere eseguito l'avviamento.
- Qualora il primo avviamento del sistema non sia effettuato da uno nostro Centro Assistenza autorizzato, la garanzia decadrà automaticamente.

FIRMA PER PRESA VISIONE/CONOSCENZA

FIRMA RICHIEDENTE	TIMBRO RICHIEDENTE
_____	_____

NOTA PER IL CENTRO ASSISTENZA

- In caso di ricevimento di questo modulo dall'installatore, prego inoltrare lo stesso a: argo.postvendita@argoclima.com.
- Terminato l'avviamento, compilare debitamente il modulo di attestazione ufficiale Argoclima.

NON INTERVENIRE SENZA AUTORIZZAZIONE.
