Documento valido solo per il territorio nazionale (Italia)

RICHIESTA DI PRIMO AVVIAMENTO VRF

Spett.le **ARGOCLIMA S.p.A.** ,

Con la presente siamo a chiedere il **PRIMO AVVIAMENTO** del sistema VRF GREE

COMPILAZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELL'INSTALLATORE RESPONSABILE DELL'IMPIANTO.

ATTENZIONE: per procedere con l'avviamento è necessario compilare tutti i campi richiesti.

IL MODULO COMPILATO IN MANIERA NON CORRETTA O INCOMPLETA POTRÀ ESSERE RIFIUTATO.

NOME PROGETTO _____

Ubicazione impianto

Nome Sig./Società/Struttura _____

Via/Piazza _____ n° _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

Telefono _____ Email _____

Rivenditore / Agenzia di vendita _____

Dati installatore

Nome Sig./Società/Struttura _____

Via/Piazza _____ n° _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____


Telefono _____ Email _____

Indicare preferenza centro assistenza (facoltativo) _____

Data indicativa richiesta per l'avviamento (ca. 10 giorni dall'invio della presente) _____

ALLEGARE ALLA RICHIESTA LO SCHEMA DI IMPIANTO, COME DA ESEMPIO SOTTOSTANTE, INDICANDO:

- modelli delle unità esterne ed interne
- lunghezze delle tubazioni <u>del liquido</u>
- diametri delle tubazioni <u>del liquido</u>

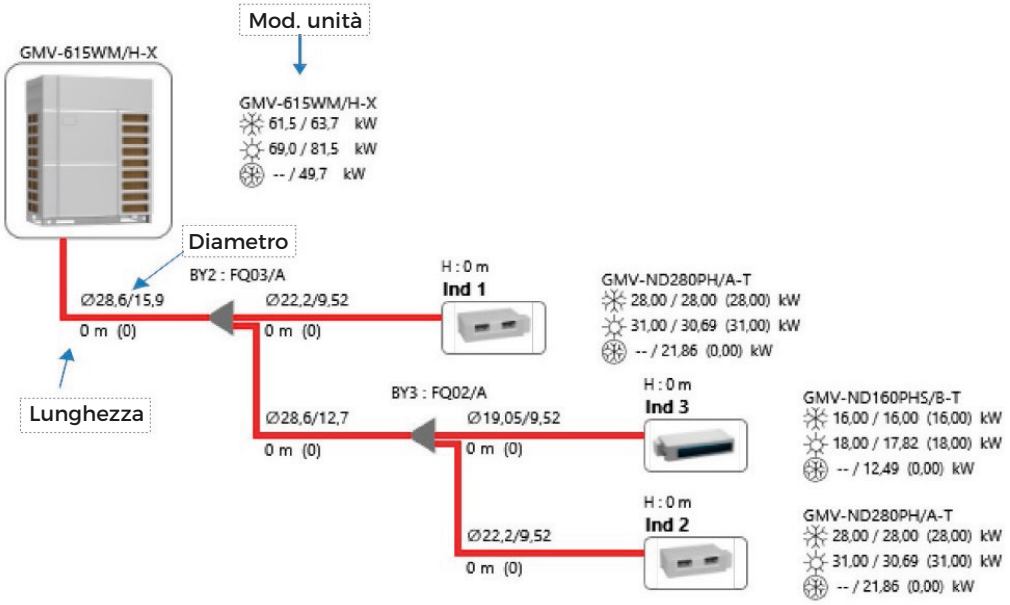

PER RICHIEDERE IL PRIMO AVVIAMENTO, CONFERMARE LE SEGUENTI VERIFICHE:

	SÌ	NO
• I prodotti sono stati installati, rispettando gli obblighi riportati sui manuali di installazione e il CAT potrà operare in totale sicurezza come previsto dalle norme vigenti;	☐	☐
• L'alimentazione elettrica è conforme a quanto riportato nei manuali di installazione e sono state rispettate le sezioni e la tipologia dei cavi da utilizzare;	☐	☐
• Sono state rispettate le misure (diametri, lunghezze e dislivelli) delle tubazioni refrigeranti, le stesse sono state riportate nel disegno da voi allegato;	☐	☐
• È stata eseguita la prova di tenuta in pressione d'azoto (minimo 32 bar, massimo 35 bar) per almeno 72 ore senza aver riscontrato perdite;	☐	☐
• Le tubazioni utilizzate e i kit di distribuzione sono adeguatamente isolati con materiale termico;	☐	☐
• I giunti ed i collettori sono stati installati come da manuale di installazione;	☐	☐
• Lo scarico della condensa, sia delle unità interne che esterne dove è previsto,è stato installato come da manuale e verificato	☐	☐
• L'impianto elettrico è stato eseguito rispettando gli schemi indicati nel manuale di installazione in dotazione alle unità.	☐	☐
• L'alimentazione elettrica come da manuale è garantita per tutte le unità esterne ed è in grado di supportare tutto il carico elettrico (non è ammessa alimentazione elettrica con generatori elettrici non certificati)	☐	☐
• l'alimentazione elettrica come da manuale è presente su tutte le unità interne e gli accessori di gestione impianto (comandi centralizzati, touch screen, interfacce, altro..)	☐	☐

Viene garantito che , all'atto del primo avviamento, le seguenti condizioni saranno rispettate ed il centro assistenza da noi delegato troverà:

- Gli schemi meccanici ed elettrici dell'impianto;
- Il circuito frigorifero con un grado di vuoto, ottenuto mediante apposita pompa, di almeno 750 torr. Sarà il CAT a confermarne lo stato.
- Bilancia con opportuno fondo scala e gas refrigerante R410A per la carica addizionale (a carico dell'installatore). NON è consentito caricare l'impianto prima dell'avviamento ed in assenza del Centro Assistenza Tecnica Argo che dovrà trovare i rubinetti di intercettazione del gas refrigerante chiusi;
- L'unità esterna e le unità interne alimentate elettricamente da almeno 8 ore prima dell'appuntamento con il CAT, per consentire il preriscaldamento dell'olio del compressore. **Se non saranno rispettate le 8 ore, l'impianto VRF NON potrà essere avviato.**
- L'installatore che ha effettuato l'installazione dell'impianto presente per tutta la durata del primo avviamento

- Il seguente modulo deve essere inoltrato al seguente indirizzo mail: **argo.postvendita@argoclima.com**
- Il Centro Assistenza Gree verificherà che l'installazione sia congruente al modulo da voi compilato e conforme ai manuali d'installazione.
- Qualora il Centro Assistenza non possa eseguire il primo avviamento per problemi di impianto, la successiva richiesta di avviamento sarà a carico dell'installatore/cliente.
- Qualora l'unità sia collegata elettricamente ad una tensione non adeguata, non si potrà eseguire l'avviamento.
- Qualora il primo avviamento del sistema, non sia effettuato da uno nostro centro assistenza autorizzato, la garanzia decadrà automaticamente.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____

TIMBRO DEL RICHIEDENTE

_____

NOTA PER IL CENTRO ASSISTENZA

In caso riceviate questo modulo direttamente dall'installatore, vi invitiamo a rigirarlo all'Ufficio Assistenza Tecnica ARGOCLIMA.
Non intervenire senza nostra autorizzazione.

Prodotto distribuito da:

argoclima S.p.A.

Sede legale: Via Alfeno Varo, 35 - 25020 Alfianello - BS - Capitale sociale € 13.416.000 i.v. - Codice fiscale e R.I. Milano- P. IVA n. 03258640964

Cod.Ident.Intracom IT03258640964 - R.E.A. BS-520586 - ECOPED 060401 - RIDOMUS 060201 - Reg. Naz. Produttori AEE IT11040000007129 - Reg. Naz. Pile IT11040P00002540
